



Wir organisieren Zukunft.

## Risikomanagement mit ibo netProject

ibo Roadshow

Kai Steinbrecher  
Produktmanager Projektmanagementsysteme



Im gesamten Projektmanagement-Prozess integriert



Projektmanagement-Prozess



Initiative

- Risiken identifizieren
- Risiken dokumentieren
- Standard-Risikokatalog



Projektdurchführung

- Risiken im Auge behalten
- Status der Risiken
- Tendenzen feststellen



Multiprojektsteuerung

- Projektübergreifend auswerten
- Tendenzen identifizieren
- Gefahren erkennen

# Risiken dokumentieren und bewerten

Risiken
Risikoportfolio

← Zurück
📄 Speichern
📄 Speichern und Neu
🗑️ Löschen

**Risiko**

Kürzel:

Bezeichnung\*:

Tragweite:  ▼      Wahrscheinlichkeit:  ▼

Schadenshöhe bei Eintritt:   ▼      Finanzielle Risikorückstellung: 96.000,00 EUR

Terminverschiebung bei Eintritt:  Tage      Zeitliche Risikorückstellung: 80,00 Tage

Risikoklasse: ■

▲ Indikatoren

- Marktlage des Partners in der Schweiz.
- Beteiligungen werden aufgegeben.
- Zusagen für den Einkauf (Italien, Schweiz, Ungarn).

▲ Ursache

Hier klicken zum Öffnen...

▲ Präventivmaßnahmen

- Absicherung des erhöhten Budget über Bestandsverträge Deutschland.
- Absicherung der Schlüsselpersonen durch Standort-Zusagen (Tarifabsicherung).
- Alternativen Einkauf über belgischen Partner sichern.


▲ Eventualmaßnahmen

Hier klicken zum Öffnen...

- Eintrittswahrscheinlichkeit**
- Bedeutung bzw. Tragweite für das Projekt**
- Skala:** Wert 1 (= gering) bis 10 (sehr groß).
- Die **Risikoklasse** wird wie folgt berechnet:
  - **A-Risiko:** 51 bis 100 (Eventualmaßnahmen und Präventivmaßnahme einleiten)
  - **B-Risiko:** 21 bis 50 (Eventualmaßnahmen und Präventivmaßnahme planen)
  - **C-Risiko:** <= 20 (Lediglich wahrnehmen)

Risiken dokumentieren und bewerten

Kürzel	Bezeichnung	Tragweite	Wahrscheinlichkeit	Finanzielle Risikorückstellung	Zeitliche Risikorückstellung [Tage]	Risikoklasse		Tendenz
						Text	Bild	
	<input type="text" value="Suchen..."/>							
R1	IT-Dienstleister kann nicht liefern	4	9	270.000,00 €	54,00	B-Risiko		
R2	Fusion mit Kooperationspartner wird vorgezogen	8	8	96.000,00 €	80,00	A-Risiko		
R3	Sub-Unternehmer kündigen	8	9	72.000,00 €	108,00	A-Risiko		
R4	Betriebsrat lehnt automatische Verarbeitung ab	5	5	10.000,00 €	10,00	B-Risiko		
R5	Technologiewandel im Bereich Backend und Datenbank	8	4	160.000,00 €	100,00	B-Risiko		

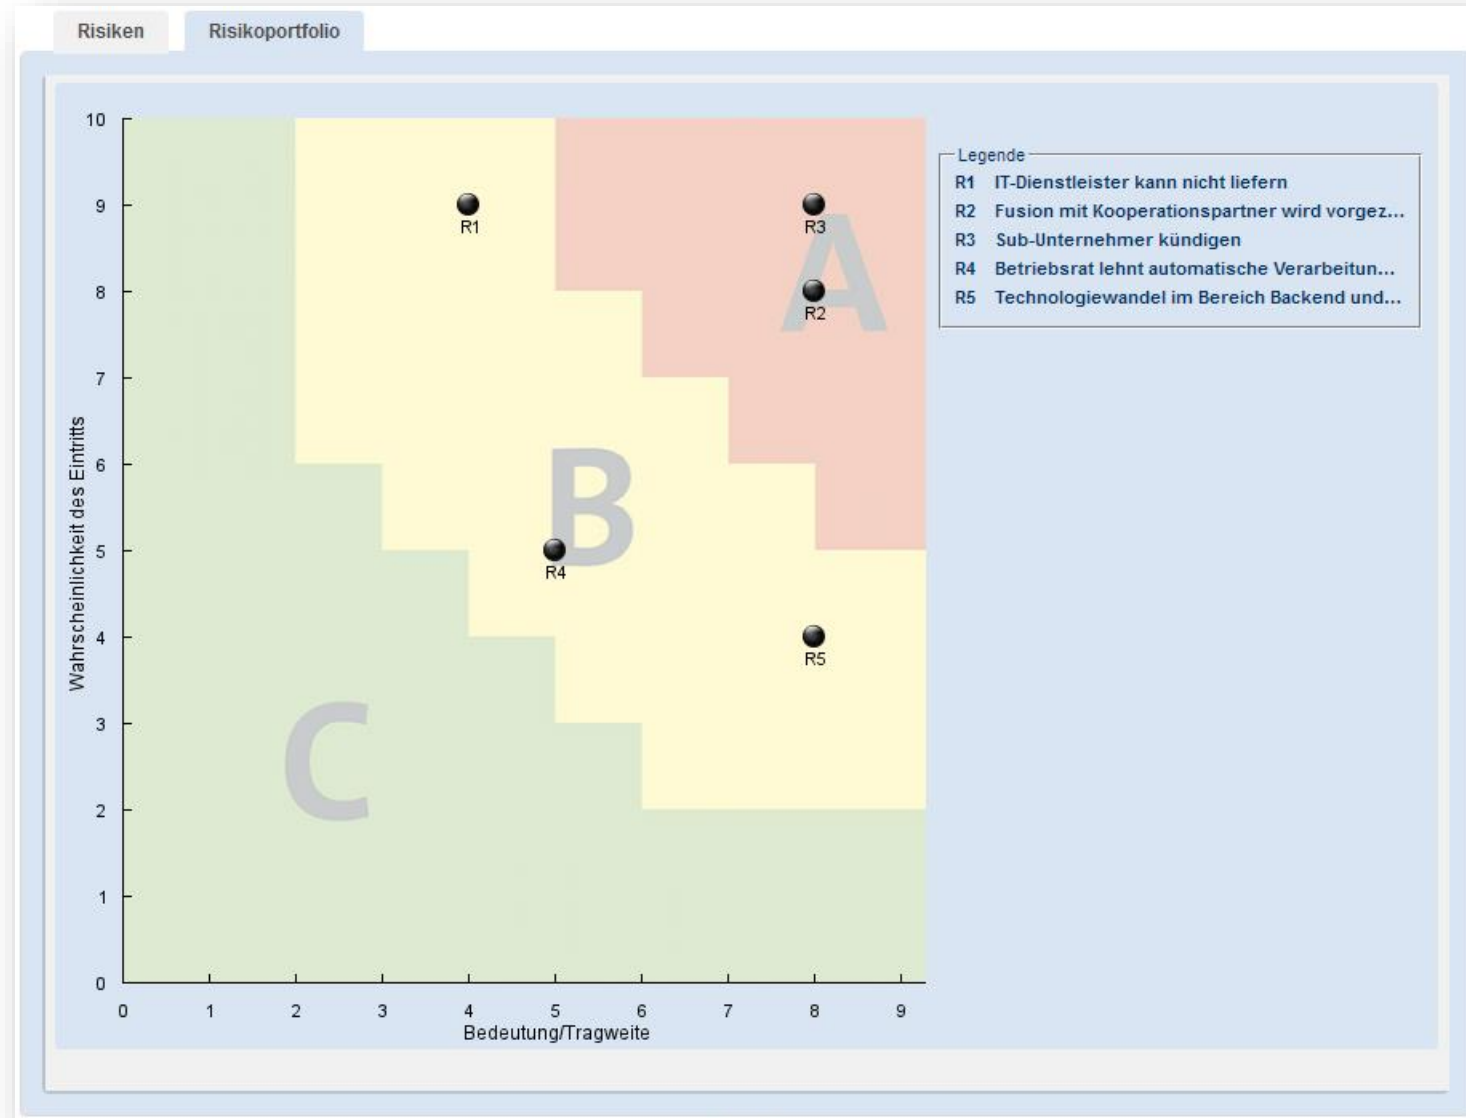

# Projektübergreifende Auswertung

Nummer	Bezeichnung	Projektleiter	Risikoklasse		Finanzielle Risikorückstellung [€]	Zeitliche Risikorückstellung [Tage]	Tendenz
IBO SW 101	Effiziente Dokumentation	Bockshorn, Alexander	B-Risiko		476.000,00	210,00	
IBO SW 102	Neuausrichtung der Internetpräsenz	Steinbrecher, Kai	B-Risiko		236.000,00	162,00	
IBO SW 103	Kunden-Prozesse 2018	Bockshorn, Alexander	B-Risiko		476.000,00	210,00	
IBO SW 104	Elektronischer Formularenservice	Steinhausen, Anja	A-Risiko		608.000,00	352,00	
IBO SW 105	Qualität und Service	Schellenberg, Annette	C-Risiko		108.000,00	79,00	
IBO SW 106	Strategie im Vertrieb	Kanzler, Stefanie	C-Risiko		180.000,00	112,00	
IBO SW 107	Qualität Personaldaten	Bender, Frank	C-Risiko		204.000,00	143,00	
IBO SW 112	Serviceprozesse	Gast, Liselotte	B-Risiko		500.000,00	230,00	
IBO SW 113	Integration Workflow-System im Kundenservice	Bender, Frank	C-Risiko		66.000,00	52,00	
IBO SW 115	Workflow-System im Bereich Projektmanagement	Steinbrecher, Kai			0,00	0,00	
					<b>2.854.000,00</b>	<b>1.550,00</b>	

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Haben Sie Fragen?



Wir organisieren Zukunft.
